Nr.	Vorgangsname	Dauer	AK	Anfang	Ende
1	Rohbau Beginn	0 Tage		Di 01.12.98	Di 01.12.98
2	Baustelleneinrichtung	10 Tage		Di 01.12.98	Mo 14.12.98
3	Erdarbeiten	32 Tage		Di 15.12.98	Fr 05.02.99
4	Oberboden abtragen	1 Tag	2	Di 15.12.98	Di 15.12.98
5	Bodenaushub	4,5 Tage	6	Mi 16.12.98	Di 22.12.98
6	Sauberkeitsschicht	1 Tag	10	Mi 23.12.98	Mi 23.12.98
7	Schalen Fundamente	10 Tage	10	Mo 04.01.99	Fr 15.01.99
8	Bewehren Fundamente	12 Tage	20	Do 07.01.99	Fr 22.01.99
9	Betonieren Fundamente	6 Tage	11	Mo 18.01.99	Mo 25.01.99
10	Verfüllen Fundamente	7 Tage	21	Di 26.01.99	Mi 03.02.99
11	Schalen Bodenplatte	0,5 Tage	10	Mo 01.02.99	Mo 01.02.99
12	Bewehren Bodenplatte	4 Tage	10	Di 02.02.99	Fr 05.02.99
13	Betonieren Bodenplatte	2 Tage	14	Do 04.02.99	Fr 05.02.99
14	Erdgeschoß	31 Tage		Mo 08.02.99	Mo 22.03.99
15	EG-Wände Schalen	20 Tage	26	Mo 08.02.99	Fr 05.03.99
16	EG-Wände Bewehren	5 Tage	5-10	Di 16.02.99	Mi 10.03.99
17	EG-Wände Betonieren	5 Tage	5-10	Do 18.02.99	Fr 12.03.99
18	EG-Fertigteilstützen & Wände	5,5 Tage	5	Di 23.02.99	Mi 03.03.99
19	EG-Decke Filigranplatten	2,5 Tage	5	Fr 05.03.99	Di 16.03.99
20	EG-Decke Einschalen	1 Tag	3	Mo 08.03.99	Mi 17.03.99
21	EG-Decke Bewehren	2,5 Tage	5-10	Di 09.03.99	Fr 19.03.99
22	EG-Decke Aufbeton	1,5 Tage	5	Mi 10.03.99	Mo 22.03.99
23	Zwischengeschof	19 Tage		Mo 22.03.99	Do 15.04.99
24	ZG-Wände Schalen	8,5 Tage	31-18	Mo 22.03.99	Do 01.04.99
25	ZG-Wände Bewehren	2,5 Tage	5-8	Mi 24.03.99	Fr 02.04.99
26	ZG-Wände Betonieren	2,5 Tage	10	Fr 26.03.99	Mo 05.04.99
27	ZG-Fertigteilstützen	1 Tag	5	Mo 29.03.99	Mo 29.03.99
28	ZG-Fertigteilunterzüge	2 Tage	5	Mi 31.03.99	Do 01.04.99
29	ZG-Decke Filigranplatten	4 Tage	10	Mo 05.04.99	Di 13.04.99
30	ZG-Decke einschalen	1,5 Tage	3	Mo 05.04.99	Mi 14.04.99
31	ZG-Decke bewehren	4 Tage	9	Mi 07.04.99	Do 15.04.99
32	ZG-Decke Aufbeton	1 Tag	20	Do 15.04.99	Do 15.04.99
33	Obergeschoß	31 Tage		Fr 16.04.99	Fr 28.05.99
34	OG-Wände Schalen	22 Tage	25	Fr 16.04.99	Mo 17.05.99
35	OG-Wände Bewehren	8 Tage	5	Mo 26.04.99	Do 20.05.99
36	OG-Wände Betonieren	11 Tage	5	Mi 28.04.99	Di 25.05.99
37	OG-Stahlträger	2 Tage	5	Mi 26.05.99	Do 27.05.99
38	OG-Trapezbleche	1 Tag	5	Fr 28.05.99	Fr 28.05.99
39	Gang	37 Tage		Mo 08.02.99	Di 30.03.99
40	Gangauflager III Schalen	6 Tage	5	Mo 08.02.99	Mo 15.02.99
41	Gangauflager II Schalen	9 Tage	5	Fr 05.03.99	Mi 17.03.99
42	Gangauflager I Schalen	4,5 Tage	5	Mo 08.03.99	Fr 12.03.99
43	Gangauflager I-II Bewehren	3 Tage	10	Mi 10.03.99	Fr 19.03.99
44	Gangauflager I Betonieren	1,5 Tage	5	Mo 15.03.99	Di 16.03.99
45	Gangauflager III Betonieren	2 Tage	5	Mo 15.03.99	Di 16.03.99
46	Gangauflager II Betonieren	3 Tage	5	Mi 24.03.99	Fr 26.03.99
47	Stahlgang montieren	1 Tag	5	Di 30.03.99	Di 30.03.99
48	Rohbau-Ende	0 Tage		Mo 31.05.99	Mo 31.05.99

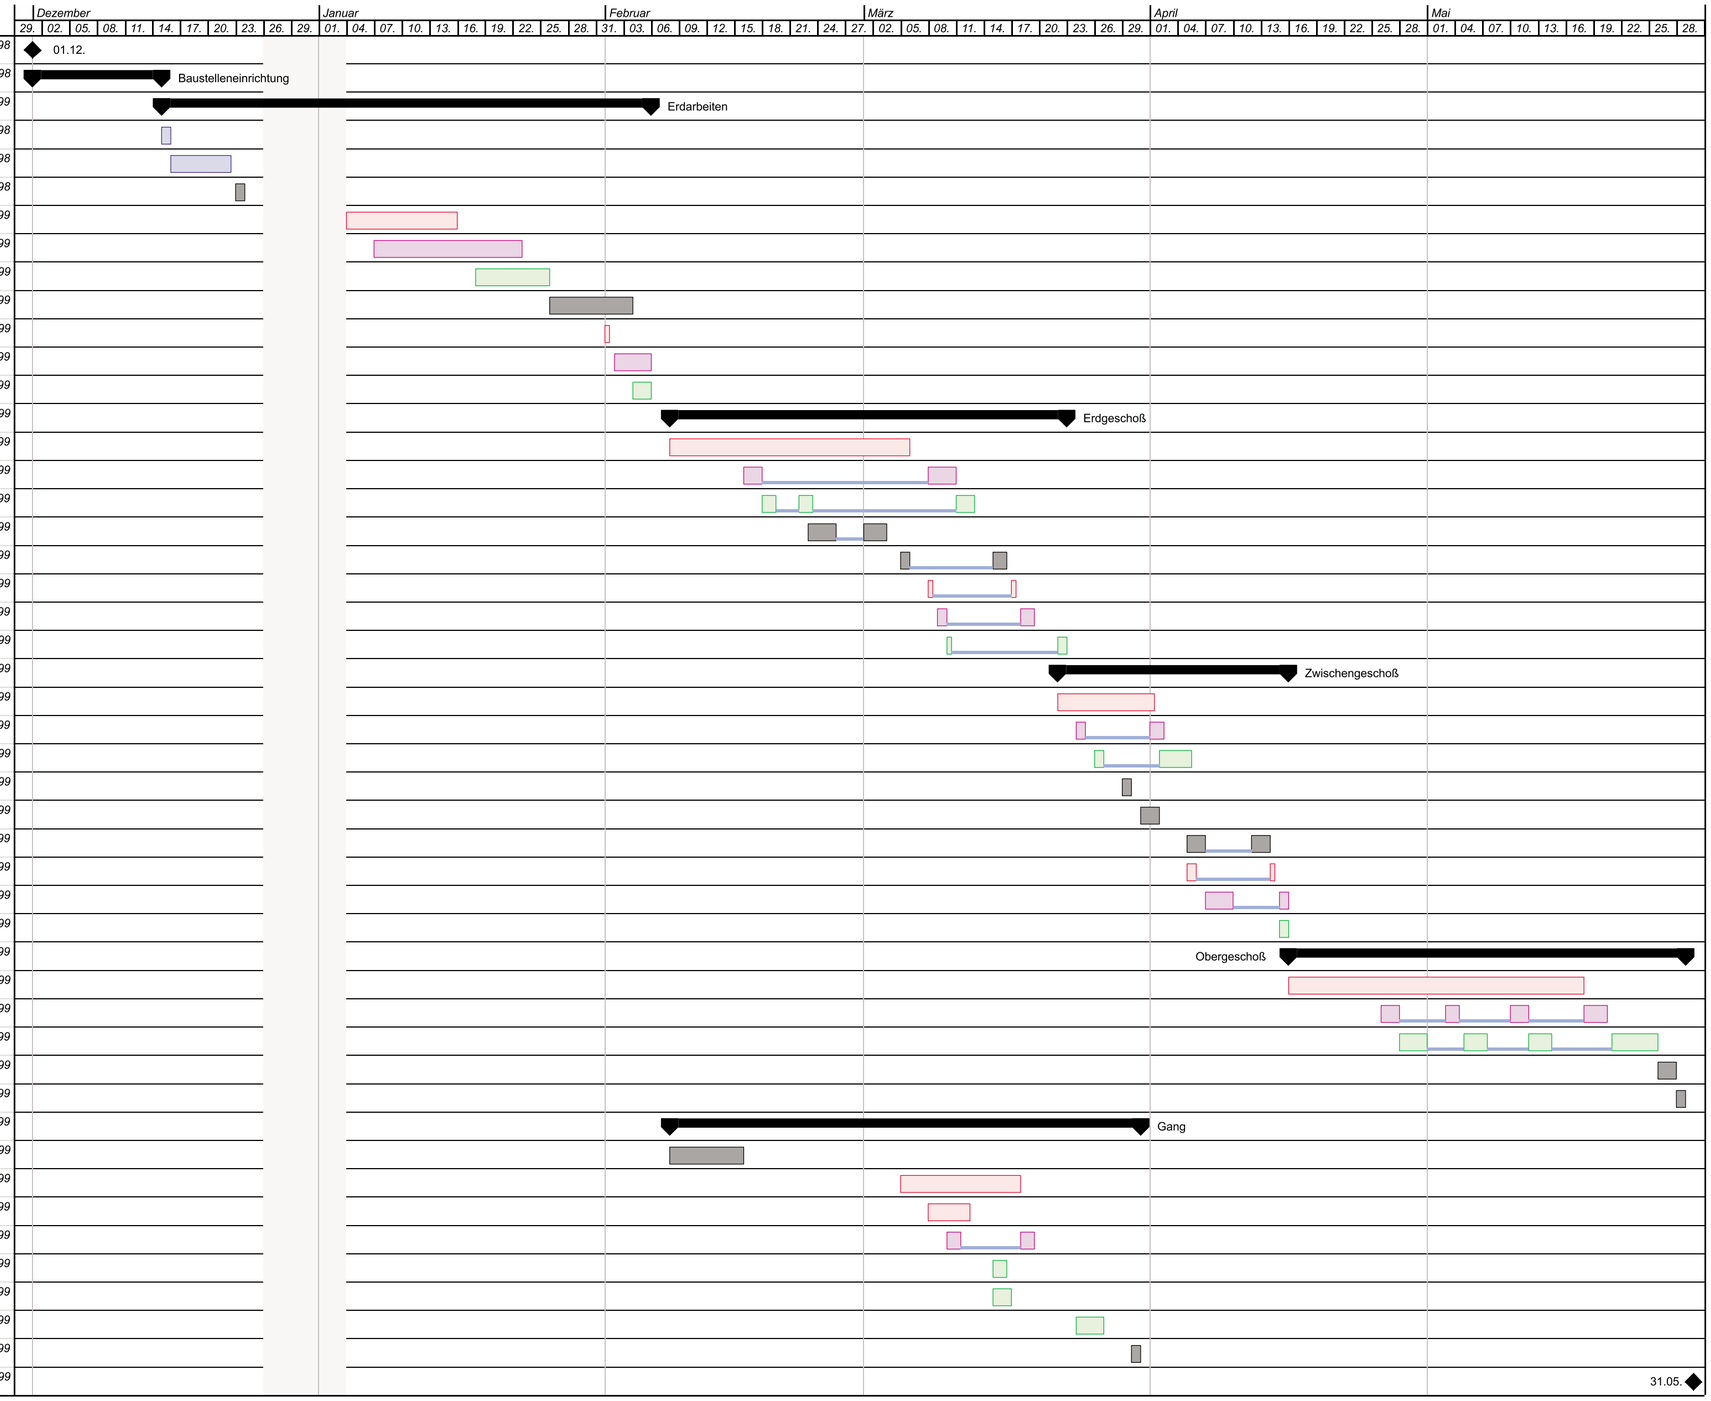

Grobterminplan
für das Gesamtprojekt

P2

98/99

Feuerwehr- und Rettungszentrum Bochum-Mitte

Alexander Bruns, Matr.-Nr. 61308
